

แบ่งงวดงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 12

(ชุมชนรวมใจพัฒนา)
สำนักงานช่าง เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แบ่งงวดก่อสร้างออกเป็น 3 งวด ดังนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมถมดินปรับระดับวางผังแนวท่อระบายน้ำ และ ถนนค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอำ

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. วางท่อเมนประปา และ ก่อสร้าง รางวีระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอำ ทุกประการ

งวดที่สุดท้าย ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอำ ทุกประการ

(นายบุญชิต หมั่นกิจ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายการราคาประมาณการก่อสร้างทางหลวงชนบทและทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประมวลราคาจากเอกสารประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขอบข่ายหน้างาน ๑๒ ไร่ขยในพัฒนา ๑๒ ไร่ขยบริเวณท่าเรือท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์และชั้นคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ผิวทางปอร์ตแลนด์และชั้นคอนกรีตหนา ๑๖ ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,283.600	310.29	1,018,868.24	1.3607	422.21	1,386,374.01
2	1.1.2 รอยต่อเอนคอนกรีตตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	592.720	51.03	30,246.50	1.3607	69.43	41,156.41
3	1.1.3 รอยต่อเอนขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	62.000	104.43	6,474.66	1.3607	142.09	8,810.06
4	1.2 รางคู ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. 2. งานรองพื้นทางและพราง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองพื้นทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	1,456.000	497.19	723,908.64	1.3607	676.52	985,022.48

วันที่ ๒๖/๑๒/๖๕

11 พฤศจิกายน 2563 10:21:56

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายการราคากลางจากงานก่อสร้างและงานโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: _____ ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขยายวงโค้งพาดนา ๑๒ ด้วยวิธีปรับระดับราคาต่อตารางเมตร (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: _____ เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อหน่วย
5	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานวัสดุที่เลือก (SELECTED MATERIALS) 3.1.1 งานวัสดุที่เลือก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	164,180	393.11	64,540.79	1.3607	534.90	87,820.65	170,907.48
6	3.2 งานถมโปงและขุดต่อ 3.2.1 งานถมโปงและขุดต่อ ขนาดกลาง	ลบ.ม.	492,540	255.01	125,602.62	1.3607	346.99	170,907.48	14,655.01
7	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. 5. งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม.	3,283.600	3.28	10,770.20	1.3607	4.46	14,655.01	14,655.01
8	6. งานขุดดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole) พร้อมฝาขอบ (รางน้ำ) ขนาด 1.00x1.00 ม.	ท่อน	727.000	1,050.86	763,975.22	1.3607	1,429.90	1,039,541.08	1,039,541.08
9	6. งานขุดดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	1,032.340	19.21	19,831.25	1.3607	26.13	26,984.38	26,984.38
10	6. งานขุดดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	80.000	6,720.14	537,611.20	1.3607	9,144.09	731,527.55	731,527.55

แบบฟอร์มรายการราคาจากภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากกองก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ โดยรวมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อหน่วย
11	7. งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole) พร้อมฝาบ่อพัก (รางวู) ขนาด 0.60x0.60 ม. 8. งานเบตตีสไลต์ (MISCELLANEOUS)	บ่อ	80.000	3,804.94	304,395.20	1.3607	5,177.38	414,190.54
12	8.1 ป้ายระหวางด้านข้างการก่อสร้าง	ชุด	2.000	1,000.00	2,000.00	1.3607	1,360.70	2,721.40
13	9. ป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ชุด	1.000	4,000.00	4,000.00	1.3607	5,442.80	5,442.80
14	10. ท่อความหนาแน่นสูง PE100 PN8 ขนาด ๓๓. 110 มม.	เมตร	548.000	285.10	156,234.80	1.3607	387.93	212,588.69
15	11. ท่อความหนาแน่นสูง PE100 PN8 ขนาด ๓๓. 90 มม.	เมตร	1,036.000	193.30	200,258.80	1.3607	263.02	272,492.14
16	12. ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นกวางขนาด ๓๓. ๑๒๐ ซม.	ชุด	2.000	8,624.00	17,248.00	1.3607	11,734.67	23,469.35
17	13. คู่มือแบบแปลนขนาด 4"	ชุด	2.000	1,600.00	3,200.00	1.3607	2,177.12	4,354.24
18	14. คู่มือต่อเขาน้ำร้อน	ชุด	12.000	800.00	9,600.00	1.3607	1,088.56	13,062.72
19	15. ป้ายบอกชื่อขอยืมรถตัดหญ้า	ชุด	1.000	15,345.00	15,345.00	1.3607	20,879.94	20,879.94
20	16. ไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	ชุด	1.000	13,950.00	13,950.00	1.3607	18,981.76	18,981.76

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓


11 มิถุนายน 2563 10:21:56

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินจากต่างประเทศและหนี้สิน

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามที่เปิดเผยพร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นของแท้และถูกต้อง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพะเยา/เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย X FN	รวมราคาต่อหน่วย
21	17. ฐานเบหลังพร้อมติดตั้ง	ชุด	2.000	16,000.00	32,000.00	1.3607		21,771.20	43,542.40	
22	18. ป้ายจราจร	ชุด	1.000	4,390.00	4,390.00	1.3607		5,973.47	5,973.47	
23	19. ป้ายจราจร N.33+เสาป้ายพร้อมติดตั้ง ๓.75+N.1+เสาป้ายพร้อมติดตั้ง	ชุด	1.000	2,110.00	2,110.00	1.3607		2,871.07	2,871.07	5,533,369.63

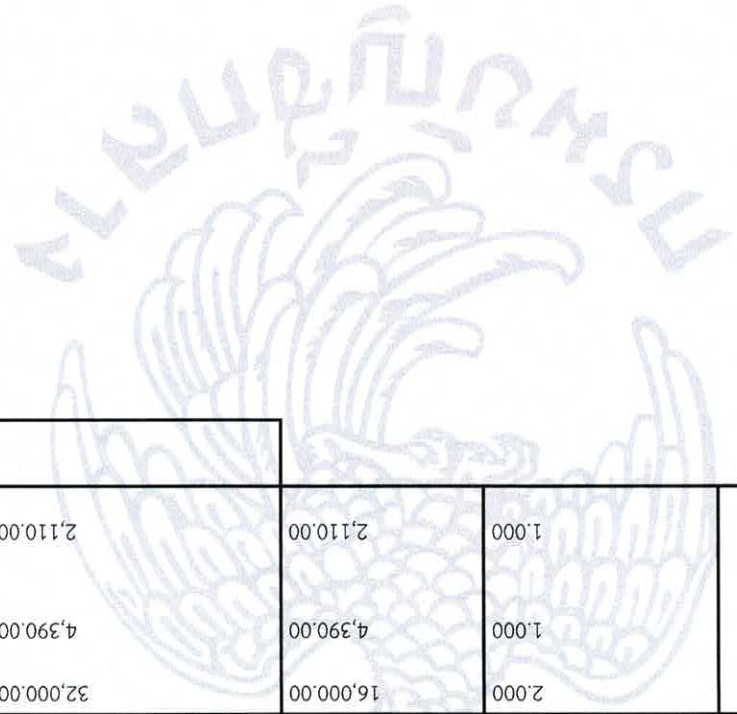



นายประจักษ์ วัฒนกุล

(๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นายประจักษ์ วัฒนกุล

(ณัฐพร ตรีรัตน์)

นายประจักษ์ วัฒนกุล

(๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ / นายประจักษ์ วัฒนกุล

(inppiq-๑) ผู้มอบหมาย: นายประจักษ์ วัฒนกุล ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้รับมอบหมาย: นายประจักษ์ วัฒนกุล ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓

ณัฐพร ตรีรัตน์ / นายประจักษ์ วัฒนกุล
